



RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL  
**PIANO DI SVILUPPO 2023**

**30 SETTEMBRE 2024**

**e-distribuzione**

*La strada per una **transizione energetica**  
sicura passa per la rete di distribuzione*



# INDICE

PREMESSA | 5

1. SINTESI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI AT e MT | 6

- 1.1 Avanzamento nazionale | 6
- 1.2 Avanzamento regionale | 8

2. MONITORAGGIO | 9

- 2.1 Interventi AT | 9
- 2.2 Interventi MT | 20

Appendice | 23

---

## Acronimi e abbreviazioni

**ARERA** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

**AT** Alta Tensione

**BT** Bassa Tensione

**CP** Cabina Primaria

**CS** Cabina Secondaria

**CSAT** Centro Satellite

**Del.** Delibera

**LMT** Linea Media Tensione

**MT** Media Tensione

**PdS** Piano di Sviluppo

**QMT** Quadro Media Tensione

**TR** Trasformatore



## PREMESSA

Il presente documento descrive lo stato di avanzamento degli interventi del Piano di Sviluppo 2023, come da disposizione ARERA (Del. n. 617/23).

Nello specifico, il “Rapporto di Monitoraggio” è articolato come di seguito descritto:

- sintesi nazionale e regionale sullo stato di avanzamento degli interventi AT e MT con relativo aggiornamento economico;
- monitoraggio degli interventi;
- appendice con la legenda relativa alla tabella di monitoraggio.

Inoltre, per il monitoraggio di dettaglio degli interventi, si rimanda all’allegato “Monitoraggio 2024 Interventi PdS 2023” predisposto in formato excel.

## 1. SINTESI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI AT E MT

Nel Piano di Sviluppo 2023 sono stati riportati n. 445 interventi nominativi AT, n. 71 interventi nominativi MT e n. 18 aggregati regionali MT che sono oggetto del seguente monitoraggio. Di questi, n.11 interventi risultano annullati per motivazioni legate principalmente a ripianificazioni per diversa soluzione tecnica.

Si fa presente, inoltre, che il format di rappresentazione utilizzato nel presente documento è il medesimo del PdS 2023: interventi AT nominativi, interventi MT nominativi (antecedenti all'edizione 2023) e interventi MT aggregati per regione (prima introduzione nel PdS 2023).

Relativamente all'aggiornamento dei dati economici, il periodo considerato è il 31 dicembre 2023 mentre per le previsioni di inizio e fine, lo stato e l'avanzamento degli interventi, si fa riferimento alle ultime informazioni disponibili.

Di seguito, alcune considerazioni rilevanti per la lettura:

- l'indicazione del ritardo (imputabile a cause esterne) e del posticipo (imputabile a cause interne) fa riferimento ad eventuali scostamenti dell'anno di entrata in esercizio;
- l'importo a vita intera è stato eventualmente ripianificato tenendo in considerazione le sole variazioni nell'anno 2023, eventuali modifiche relative agli anni successivi saranno riportate nel prossimo Piano di Sviluppo;
- in riferimento agli aggregati regionali MT, per quanto concerne lo stato e l'avanzamento, sono stati indicati quelli prevalenti per ogni aggregato.

### 1.1. Avanzamento nazionale

Complessivamente, il 12% degli **interventi AT nominativi** sono in anticipo, il 65% risulta in linea con le tempistiche previste nel PdS 2023, mentre l'11% risulta in ritardo per cause esterne e il 12% è stato posticipato per ripianificazioni dovute a revisione priorità.

L'importo aggiornato degli investimenti a vita intera di tutti gli **interventi AT<sup>1</sup>** è pari a 1.643 Mln€ (+6 Mln€ vs. PdS 2023), con un consuntivo al 31/12/2023 di 321 Mln€.

Relativamente agli **interventi MT nominativi**, il 4% è in anticipo, il 56% risulta come da programma mentre il 22% risulta in ritardo e il 18% posticipato.

L'importo aggiornato degli investimenti a vita intera degli **interventi MT<sup>1</sup>** nominativi è pari a 78 Mln€ (+2 Mln€ vs. PdS 2023) con un consuntivo al 31/12/2023 di circa 44 Mln€.

Avanzamento al 31/12/2023	Livello di tensione	Numero (%) interventi	Consuntivi al 2023 [Mln €]	Variazione investimento a vita intera [Mln €]
In anticipo	AT	53 (12%)	36	2
Come da programma		283 (65%)	145	9
In ritardo		48 (11%)	104	-4
Posticipati		53 (12%)	36	-1

<sup>1</sup> Ad esclusione degli interventi annullati

Avanzamento al 31/12/2023	Livello di tensione	Numero (%) interventi	Consuntivi al 2023 [Mln €]	Variazione investimento a vita intera [Mln €]
In anticipo	MT	3 (4%)	1	-
Come da programma		38 (56%)	30	1
In ritardo		15 (22%)	9	1
Posticipati		12 (18%)	4	-

Tabella 1- Avanzamento nazionale interventi AT ed MT nominativi

Infine, gli **interventi MT aggregati** presentano un costo a vita intera aggiornato al 2023 pari a 778 Mln€ e un valore di consuntivo al 2023 pari a 280 Mln€.

Per quanto riguarda lo stato degli interventi, si riporta nei grafici seguenti la suddivisione percentuale relativa ai lavori AT ed MT nominativi.

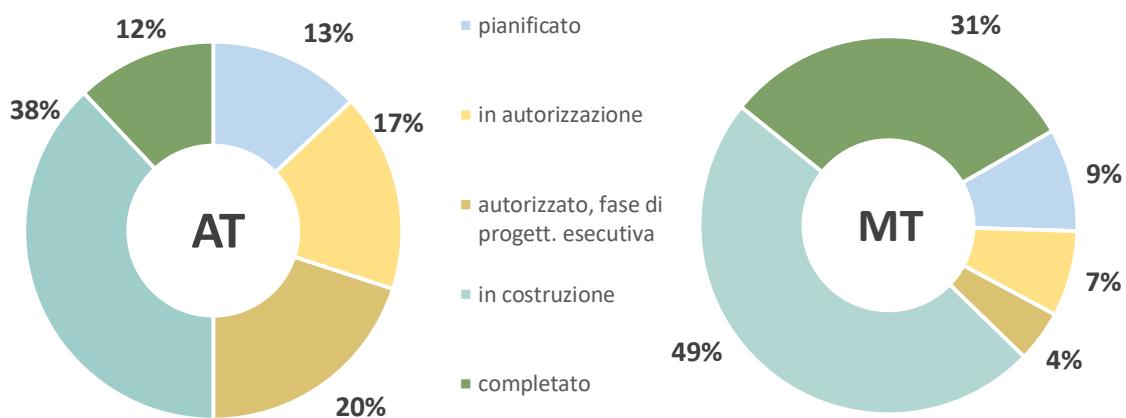


Figura 1-Ripartizione % degli interventi per stato di esecuzione

Per gli interventi MT aggregati, lo stato prevalente risulta essere “in costruzione”.

## 1.2. Avanzamento regionale

In aggiunta a quanto riportato nella sezione precedente, si rappresentano di seguito i dettagli a livello regionale per gli interventi nominativi AT ed MT.

**Focus interventi AT nominativi con stato di avanzamento come da programma e in anticipo**

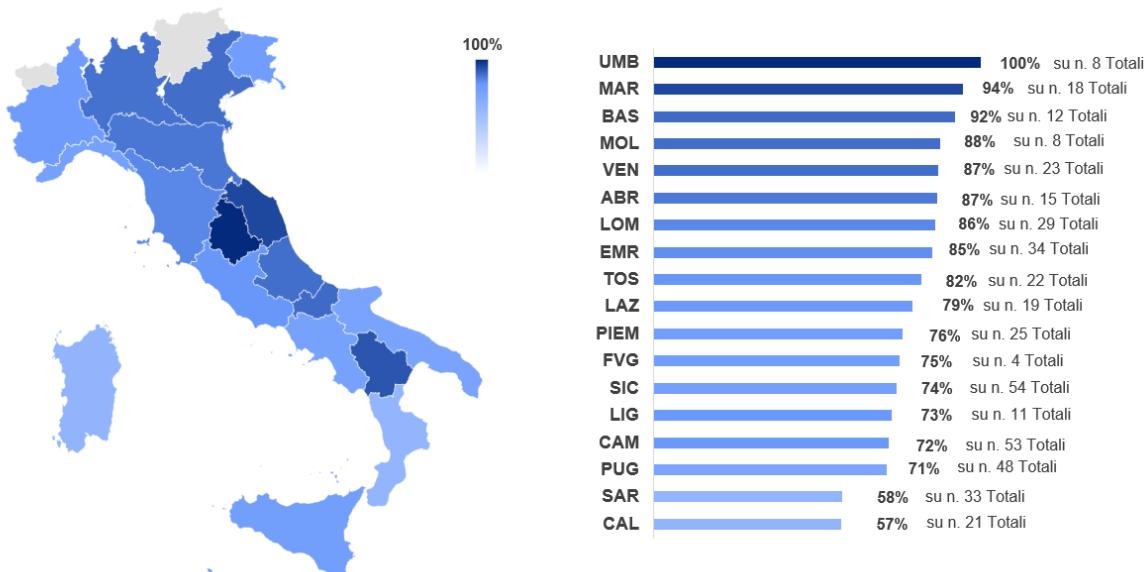


Figura 2 – Percentuale interventi AT nominativi con stato “come da programma” e “in anticipo”

**Focus interventi MT nominativi con stato di avanzamento come da programma e in anticipo**

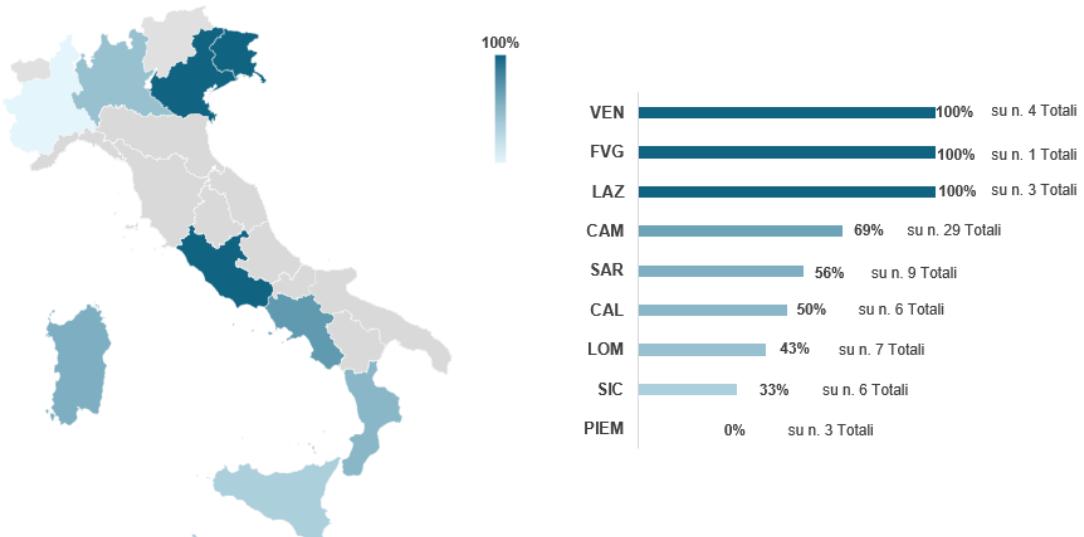


Figura 3 – Percentuale interventi MT nominativi con stato “come da programma” e “in anticipo”

## 2. MONITORAGGIO

### 2.1. Interventi AT

#### Interventi AT nominativi

Nome Intervento	Area Geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
Ampliamento CP Melfi	Basilicata	2020	2025	in costruzione	come da programma	782
Ampliamento CP Olgiate O.	Lombardia	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	266
Nuova CP CORDENONS	Friuli-Venezia Giulia	2022	2026	in autorizzazione	come da programma	24
Potenziamento CP Pessina	Lombardia	2023	2024	in costruzione	in anticipo	748
Potenziamento CP Casalbuttano	Lombardia	2023	2024	in costruzione	in anticipo	808
Potenziamento CP Moio	Lombardia	2023	2024	in costruzione	in anticipo	384
Ampliamento CP Sermide	Lombardia	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	posticipazione volontaria	671
Ampliamento CP Comessaggio	Lombardia	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	104
Ampliamento CP S. Stefano	Lombardia	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	344
Ampliamento CP Suzzara	Lombardia	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	558
Nuova CP Valdaro (ex Mantova Sud)	Lombardia	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	41
Nuova CP ORIO L.	Lombardia	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	27
Nuova CP PIZZALE (ex Lungavilla)	Lombardia	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	29
Nuova CP OLBIA PORTO	Sardegna	2022	2027	pianificato	come da programma	4
Nuova CP NOICATTARO	Puglia	2022	2027	pianificato	come da programma	13
Nuova CP ALTISSOLA MILICIA	Sicilia	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	40
Posa TR + QMT CP CAPPELLAZZO	Piemonte	2023	2025	in costruzione	come da programma	279
Potenziamento CP ALBISSOLA + QMT	Liguria	2023	2024	in costruzione	in anticipo	67
Potenziamento CP GARESSIO	Piemonte	2025	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Potenziamento CP ISORELLA	Piemonte	2024	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Potenziamento CP ASTI N + QMT	Piemonte	2024	2025	pianificato	come da programma	0
Ampliamento CP CASALE M. + QMT	Piemonte	2024	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Potenziamento CP CUNEO S. G. + QMT	Piemonte	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	349
Sostituzione TR CP S. GIOVANNI B.	Liguria	2024	2025	in autorizzazione	come da programma	0
Ampliamento CP NOVARA N.+ QMT	Piemonte	2024	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Sostituzione TR CP SESTRI LEVANTE	Liguria	2024	2025	pianificato	come da programma	0
Nuova CP PIOVERA	Piemonte	2023	2026	in costruzione	come da programma	47
Nuova CP SANT. ALBANO	Piemonte	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	38
Ampliamento CP Cirò M.	Calabria	2022	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	983
Ampliamento CP Taranto Molo	Puglia	2022	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	15
Nuova CP Palazzolo Acreide	Sicilia	2022	2028	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	posticipazione volontaria	55
CP CONEGLIANO - Rif. Sez. MT	Veneto	2023	2027	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	4
CP GARDA - Rif. Sez. MT	Veneto	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	10
Potenziamento CP ZELARINO	Veneto	2024	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	0
Nuova CP CEGLIE MESSAPICA	Puglia	2022	2027	pianificato	come da programma	2

Nome Intervento	Area Geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
Potenziamento CP CAORLE	Veneto	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	293
Potenziamento CP DONADA	Veneto	2023	2025	in costruzione	come da programma	81
Potenziamento CP GIAIS	Friuli-Venezia Giulia	2023	2025	in costruzione	come da programma	19
Nuova CP CENESELLI	Veneto	2023	2026	in costruzione	come da programma	25
Nuova CP VIGHIZZOLO	Veneto	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	26
Nuova CP ANGUILLARA	Veneto	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	27
Nuova CP ARCELLA	Veneto	2023	2026	in costruzione	come da programma	29
Nuova CP FONTANAFREDDA	Friuli-Venezia Giulia	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	27
Nuova CP BITTI	Sardegna	2022	2028	pianificato	posticipazione volontaria	5
Nuova CP VOLTABAROZZO	Veneto	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	28
Nuova CP FAVARO	Veneto	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	27
Nuova CP FRATTA POLESINE	Veneto	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	11
Nuovo CSat Arca	Lazio	2022	2025	in autorizzazione	come da programma	71
Potenziamento e Ampliamento CP Mazara 2	Sicilia	2022	2025	in costruzione	posticipazione volontaria	45
Nuova CP Cammarata	Calabria	2022	2026	in autorizzazione	come da programma	29
Ampliamento SEZ MT CP TEMPIO	Sardegna	2023	2026	in costruzione	posticipazione volontaria	30
Ampliamento CP Buonvicino	Calabria	2022	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	975
Sostituzione TR CP Messina Nord	Sicilia	2022	2027	pianificato	come da programma	6
Nuova CP CAPOTERRA	Sardegna	2021	2027	pianificato	come da programma	10
Nuova CP TROIA EST(EX BORGO SEGEZIA)	Puglia	2022	2026	pianificato	come da programma	11
Nuova CP TISSI	Sardegna	2021	2028	pianificato	posticipazione volontaria	13
Nuova CP ABBASANTA	Sardegna	2021	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	28
Nuova CP MOGORELLA ED	Sardegna	2021	2028	pianificato	posticipazione volontaria	9
Ampliamento e Potenziamento CP San Salvo	Abruzzo	2022	2025	in costruzione	come da programma	532
Nuova CP SAMASSI	Sardegna	2021	2028	pianificato	posticipazione volontaria	9
Nuova CP SORGONO	Sardegna	2026	2028	pianificato	posticipazione volontaria	0
Potenziamento San Donato G/B	Abruzzo	2022	2027	pianificato	posticipazione volontaria	706
Ampliamento CP LULA	Sardegna	2023	2024	in costruzione	in anticipo	957
Ampliamento CP SILIGO	Sardegna	2023	2024	in costruzione	in anticipo	310
Nuova CP SELARGIUS ED	Sardegna	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	2
Nuova CP NARDO'	Puglia	2022	2027	pianificato	come da programma	11
Nuova CP CAGLIARI PORTO	Sardegna	2021	2027	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	posticipazione volontaria	76
Nuova CP QUARTU SUD	Sardegna	2021	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	40
Nuovo CSat Vibo Valentia	Calabria	2022	2026	in autorizzazione	posticipazione volontaria	274
Sostituzione TR CP San Donato R/V	Abruzzo	2021	2023	completato	come da programma	735
Nuova CP Trasimeno	Umbria	2022	2025	in costruzione	come da programma	604
Potenziamento CP Sessa Aurunca	Campania	2022	2024	in costruzione	come da programma	24
Ampliamento CP Soverato	Calabria	2022	2025	in costruzione	posticipazione volontaria	908
Potenziamento CP CASTELLAMARE	Sicilia	2024	2025	in costruzione	posticipazione volontaria	0
Ampliamento Sez. MT CP PALAU	Sardegna	2021	2024	in costruzione	come da programma	192
Nuova CP Borgo Vicaretto	Sicilia	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	32

Nome Intervento	Area Geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
Rinnovo sez.CP FUNGHERA	Piemonte	2022	2026	in autorizzazione	come da programma	442
Rifacimento CP VALLECROSIA	Liguria	2022	2028	pianificato	posticipazione volontaria	35
Nuova CP TORREVECCHIA P.	Lombardia	2022	2026	in costruzione	come da programma	244
Potenziamento CP SACCA SERENELLA	Veneto	2022	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	27
Nuova CP ARMENTO 2	Basilicata	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	40
Nuova CP TERRANOVA 2	Calabria	2022	2026	in autorizzazione	come da programma	35
Nuova CP BIANCAVILLA	Sicilia	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	26
Nuova CP S.CIPIRRELLO	Sicilia	2022	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	39
Nuova CP GRAMMICHELE	Sicilia	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	19
Nuova CP ORETO	Sicilia	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	32
Nuova CP MOTTA S.ANASTASIA	Sicilia	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	26
Nuova CP PACECO	Sicilia	2022	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	82
Nuova CP C.S. Giovanni	Emilia-Romagna	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	97
Ampliamento CP P.ARMERINA	Sicilia	2023	2024	in costruzione	in anticipo	9
Ampliamento CP S.C.CAMERINA	Sicilia	2023	2024	in costruzione	in anticipo	105
Nuova CP RAMACCA 2	Sicilia	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	23
Ampliamento CP UNIVERSITA'	Sicilia	2023	2025	pianificato	come da programma	6
Nuova CP Beatrice	Lazio	2022	2026	in autorizzazione	come da programma	67
Potenziamento CP BARCA	Sicilia	2023	2024	in costruzione	in anticipo	13
Potenziamento CP S.G. LA PUNTA	Sicilia	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	81
Potenziamento CP SALEMI	Sicilia	2023	2024	in costruzione	in anticipo	379
Potenziamento CP VILLAFRANCA	Sicilia	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	1
Potenziamento CP VIZZINI	Sicilia	2023	2025	in costruzione	come da programma	36
Potenziamento CP BELPASSO	Sicilia	2023	2025	pianificato	come da programma	5
Potenziamento CP BAGHERIA	Sicilia	2023	2025	pianificato	come da programma	1
Nuova CP GUARDIA LOMBARDI	Campania	2022	2026	in autorizzazione	come da programma	40
Nuova CP PRESENZANO	Campania	2023	2027	in autorizzazione	come da programma	13
Nuova CP PORTO PONENTE	Campania	2027	2030	pianificato	posticipazione volontaria	0
Nuova CP PORTO LEVANTE	Campania	2026	2028	pianificato	posticipazione volontaria	0
Nuova CP ARZANO	Campania	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	14
Nuova CP Belizzi (ex CP Battipaglia)	Campania	2023	2028	in autorizzazione	come da programma	13
Nuova CP Formicola (ex Pontelatone)	Campania	2023	2028	in autorizzazione	come da programma	13
Nuova CP MONTELUNGO	Campania	2023	2027	pianificato	come da programma	8
Nuova CP BUSETO	Sicilia	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	97
Potenziamento CP CAPODRISE	Campania	2023	2024	completato	come da programma	15
Potenziamento CP SOMMA.V	Campania	2024	2026	in costruzione	posticipazione volontaria	0
Ampliamento / Potenziamento / Rifacimento QMT CP Agropoli	Campania	2023	2026	in costruzione	come da programma	7
Ampliamento CP Latina Torre la Felce	Lazio	2022	2026	pianificato	come da programma	37
Nuova CP PIGNATARO MAGGIORI	Campania	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	14
Nuova CP CAVA	Campania	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	8
Potenziamento CP Bondeno	Emilia-Romagna	2025	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Nuova CP Corato Sud	Puglia	2023	2030	pianificato	posticipazione volontaria	6

Nome Intervento	Area Geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
Nuova CP Casalotto	Calabria	2022	2026	in costruzione	come da programma	78
Ampliamento CP Maranello	Emilia-Romagna	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	83
Nuova Cabina Utente Borgo Vicaretto	Sicilia	2021	2023	completato	in anticipo	1.122
Nuova CP Francavilla	Calabria	2021	2024	in costruzione	in anticipo	1.166
CP Taranto - Rif. Sez. MT	Puglia	2023	2027	pianificato	come da programma	1
Nuova CP ADELFA	Puglia	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	16
Ampliamento CP Tito	Basilicata	2020	2024	in costruzione	come da programma	968
Nuova CP CAGNANO	Puglia	2023	2027	pianificato	come da programma	1
Nuova CP MARUGGIO	Puglia	2023	2027	pianificato	come da programma	1
Nuova CP LESINA (EX RIPALTA)	Puglia	2023	2026	pianificato	come da programma	18
Ampliamento CP VIESTE + QMT	Puglia	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	15
CP FASANO -Rif. Sez. MT	Puglia	2023	2027	pianificato	come da programma	7
Nuova CP OTRANTO	Puglia	2023	2028	pianificato	posticipazione volontaria	4
Ampliamento CP CHEREMULE	Sardegna	2022	2024	in costruzione	in anticipo	371
Potenziamento CP Piombino	Toscana	2022	2026	in costruzione	come da programma	418
Nuova CP TARANTO MARE (EX PULSANO)	Puglia	2026	2027	pianificato	come da programma	0
Nuova CP ROCA	Puglia	2026	2027	pianificato	come da programma	0
Nuova CP Borgo Quattordici	Abruzzo	2022	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	128
Ampliamento CP Borgia	Calabria	2022	2025	in costruzione	in ritardo	936
Potenziamento CP PISTICCI	Basilicata	2023	2024	in costruzione	come da programma	909
Potenziamento BARI CIRCO	Puglia	2023	2024	pianificato	come da programma	2
Ampliamento Castrovilliari	Calabria	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	posticipazione volontaria	1.008
Ampliamento CP Benevento Ind	Campania	2020	2024	in costruzione	come da programma	1.158
Nuova CP S.Clemente	Emilia-Romagna	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	176
Nuova CP BERNALDA 2	Basilicata	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	14
Nuova CP LUCERA 2(EX BISI2)	Puglia	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	9
Nuova CP VENOSA 2 (ex BOREANO)	Basilicata	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	13
Nuova CP GUAGNANO(EX CAMPI OV2)	Puglia	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	18
Nuova CP CANDELA 3	Puglia	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	8
Nuova CP Ginosa M. Nord (ex Cast.S.2)	Puglia	2023	2027	in autorizzazione	posticipazione volontaria	18
Nuova CP FAGGIANO (EX ROCCAFORZATA 2)	Puglia	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	18
Nuova CP TRIVIGNO 2	Basilicata	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	14
Nuova CP TORREMAGGIORE (ex casalv2)	Puglia	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	9
Nuova CP CERIGNOLA NORD 2	Puglia	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	9
Nuova CP CAST.MAR.N(ex Gin.L.Po22)	Puglia	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	17
Ampliamento CP POTENZA	Basilicata	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	1
Nuova CP VAGLIO	Basilicata	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	14
Nuova CP SALICE	Puglia	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	18
Ampliamento CP Blasi	Puglia	2023	2024	in costruzione	come da programma	101
Ampliamento CP San Paolo	Puglia	2023	2024	in costruzione	come da programma	71
Nuova CP Cerignola Ovest	Puglia	2023	2028	in autorizzazione	posticipazione volontaria	8
Ampliamento CP MONOPOLI	Puglia	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	53

Nome Intervento	Area Geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
Potenziamento CP BRINDISI IND. 2	Puglia	2023	2024	pianificato	in anticipo	2
CP Gravina- Real. 3° montante	Puglia	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	47
Ampliamento CP San Pancrazio Salent	Puglia	2023	2026	in costruzione	come da programma	33
Ampliamento Sez. MT CP IGLESIAS	Sardegna	2021	2027	in autorizzazione	come da programma	839
Potenziamento CP SOMMARIVA B.	Piemonte	2021	2024	in costruzione	come da programma	782
Ampliamento CP Vibo V.	Calabria	2022	2025	in costruzione	posticipazione volontaria	754
Ampliamento CP Rossano	Calabria	2021	2023	completato	come da programma	2.086
Nuova CP Campofranco	Sicilia	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	posticipazione volontaria	236
Potenziamento CP GRAVELLONA	Piemonte	2020	2025	in autorizzazione	come da programma	410
Rifacimento quadro MT 3°TR CP Matarocco	Sicilia	2021	2023	completato	come da programma	778
Ampliamento CP SCICLI	Sicilia	2020	2024	in costruzione	in anticipo	904
Ampliamento CP Rosciano	Abruzzo	2021	2025	in costruzione	in anticipo	689
Potenziamento CP Abbadia	Toscana	2022	2027	in costruzione	come da programma	767
CP Commenda rif. e ampl. QAT	Calabria	2022	2028	in costruzione	posticipazione volontaria	1.724
Nuova CP S.IRENE	Calabria	2023	2030	in autorizzazione	posticipazione volontaria	17
Ampliamento CP Matarocco	Sicilia	2021	2026	in autorizzazione	come da programma	167
Nuova CP LIVIGNO	Lombardia	2021	2025	in costruzione	come da programma	8.252
Nuova CP Cecita	Calabria	2023	2024	in costruzione	come da programma	925
Nuova CP Praia a Mare	Calabria	2024	2024	in costruzione	come da programma	0
Potenziamento CP Sant'Omero	Abruzzo	2025	2025	in costruzione	come da programma	0
Sostituzione TR CP BAGHERIA	Sicilia	2022	2023	completato	come da programma	407
Ampliamento CP Castel S.Pietro	Emilia-Romagna	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	20
Ampliamento CP Castelfranco	Emilia-Romagna	2024	2025	in autorizzazione	come da programma	0
Ampliamento CP Castelmaggiore	Emilia-Romagna	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	6
Ampliamento CP Cento	Emilia-Romagna	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	1
Nuova CP Ferrara Imperiale	Emilia-Romagna	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	58
Ampliamento CP Ferrara Sud	Emilia-Romagna	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	9
Nuova CP Forlì Ovest	Emilia-Romagna	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	56
Ampliamento CP Forlì Via Lunga	Emilia-Romagna	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	17
Sostituzione TR CP SARROCH	Sardegna	2022	2023	completato	come da programma	481
Potenziamento CP Monteviglio	Emilia-Romagna	2023	2024	in costruzione	come da programma	936
Ampliamento CP Ponte Fossa	Emilia-Romagna	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	20
Ampliamento CP Reggio Nord	Emilia-Romagna	2023	2026	pianificato	come da programma	14
Ampliamento CP Riccione	Emilia-Romagna	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	36
Ampliamento CP S.Agostino	Emilia-Romagna	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	17
Potenziamento CP S.Agostino	Emilia-Romagna	2023	2024	completato	come da programma	56
Stallo AT CP MAZARA	Sicilia	2022	2023	completato	come da programma	516
Potenziamento CP S.Prospero	Emilia-Romagna	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	in ritardo	53
Ampliamento CP San Donato	Emilia-Romagna	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	79
Ampliamento CP GELAPON	Sicilia	2021	2024	in costruzione	come da programma	1.541
Ampliamento CP Schiappa	Emilia-Romagna	2023	2025	in costruzione	come da programma	3
Potenziamento CP Schiappa	Emilia-Romagna	2024	2024	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	in anticipo	0

Nome Intervento	Area Geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
Potenziamento CP Latina Scalò	Lazio	2025	2025	pianificato	posticipazione volontaria	0
Potenziamento CP Pontina	Lazio	2027	2027	pianificato	posticipazione volontaria	0
Potenziamento CP Campo di Carne	Lazio	2023	2024	in costruzione	in anticipo	113
Ampliamento CP Canino	Lazio	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	26
Ampliamento CP Lentini	Sicilia	2021	2024	in costruzione	come da programma	934
Ampliamento CP Parco	Lazio	2023	2024	in costruzione	in anticipo	728
Nuova CP TRUNCU REALE	Sardegna	2021	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	572
Nuova CP Elizabeth	Lazio	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	38
Nuova CP Torre Astura	Lazio	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	39
Ampliamento CP Manfr.Ind.	Puglia	2022	2026	in autorizzazione	come da programma	742
CP PONTE MALON - Acquisizione Sez. AT	Veneto	2021	2025	in costruzione	come da programma	838
Ampliamento CP Cercemaggiore	Molise	2025	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Sostituzione TR CP SETTIMO	Piemonte	2021	2024	in costruzione	posticipazione volontaria	826
Nuova CP Foggia Onoranza	Puglia	2021	2025	in costruzione	in ritardo	1.600
Potenziamento CP Castel Del Giudice	Molise	2023	2024	in costruzione	come da programma	58
Potenziamento CP Roccavivara	Molise	2023	2024	in costruzione	come da programma	73
Potenziamento CP Scoppito	Abruzzo	2023	2024	in costruzione	in anticipo	132
Potenziamento CP Fano Potenziamento	Marche	2023	2024	in costruzione	in anticipo	100
Potenziamento CP Pozzilli	Molise	2023	2024	in costruzione	in anticipo	19
Potenziamento CP Castelbellino	Marche	2023	2024	in costruzione	in anticipo	111
Potenziamento CP Portocannone	Molise	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	posticipazione volontaria	35
Ampliamento CP Pietracatella	Molise	2025	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Ampliamento CP Sesto Campano	Molise	2025	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Nuova CP Francavilla al Mare	Abruzzo	2025	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Ampliamento CP SCIACCA	Sicilia	2021	2024	in costruzione	in ritardo	1.298
Ampliamento CP Montelabbate	Marche	2025	2026	pianificato	come da programma	0
Nuova CP Lunano	Marche	2022	2026	in autorizzazione	come da programma	40
Potenziamento CP Sassoferato	Marche	2025	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Potenziamento CP Vasto	Abruzzo	2024	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Potenziamento CP Montesilvano	Abruzzo	2024	2025	in autorizzazione	come da programma	0
Ampliamento CP Civitanova	Marche	2025	2026	pianificato	come da programma	0
Ampliamento CP Corneto	Marche	2025	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Ampliamento CP Sinarca	Molise	2024	2026	in autorizzazione	come da programma	0
Ampliamento CP Sortino	Sicilia	2021	2024	in costruzione	come da programma	1.110
Nuova CP Silvi	Abruzzo	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	30
Nuova CP Mosciano	Abruzzo	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	58
Nuova CP Loreto Aprutino	Abruzzo	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	22
Nuova CP Marischio	Marche	2022	2026	in autorizzazione	come da programma	29
Nuovo CSat AVELLA	Campania	2024	2026	pianificato	come da programma	0
Potenziamento CP S.Angelo in Vado	Marche	2025	2026	pianificato	come da programma	0
Potenziamento CP Sassocorvaro	Marche	2025	2026	pianificato	come da programma	0
Ampliamento CP Visso	Marche	2023	2024	in costruzione	in anticipo	110
Sostituzione TR CP Rocca Priora	Marche	2025	2026	pianificato	come da programma	0

Nome Intervento	Area Geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
Sostituzione TR CP PORTO D'ASCOLI	Marche	2024	2026	pianificato	come da programma	0
Sostituzione TR CP Caltagirone	Sicilia	2022	2023	completato	in anticipo	1.273
Ampliamento CP Arezzo A	Toscana	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	8
Nuova CP Careggi	Toscana	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	48
Nuova CP Castel Giorgio	Umbria	2023	2025	in costruzione	come da programma	32
Potenziamento CP Castiglione del Lago	Umbria	2022	2024	in costruzione	in anticipo	364
Ampliamento CP Chiara	Toscana	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	58
Potenziamento CP Città di Castello	Umbria	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	7
Nuova CP Ferentillo	Umbria	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	36
Sostituzione TR CP Grosseto Nord sostituzione	Toscana	2025	2027	pianificato	come da programma	0
Nuova CP Gualdo Tadino 2	Umbria	2023	2026	in costruzione	come da programma	28
Nuova CP Montegemoli Z.I.	Toscana	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	31
Ampliamento CP Montevarchi	Toscana	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	17
Potenziamento CP Pietrasanta	Toscana	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	3
Potenziamento CP TROIA	Puglia	2021	2024	completato	posticipazione volontaria	1.326
Potenziamento CP Poggibonsi + Rif. Sez. MT	Toscana	2024	2025	in costruzione	come da programma	0
Potenziamento CP Portoferraio	Toscana	2025	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	0
Sostituzione CP San Gemini	Umbria	2024	2027	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	0
Ampliamento CP Tavola	Toscana	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	3
Nuova CP Carini 2	Sicilia	2021	2027	in costruzione	in ritardo	2.408
Potenziamento CP Umbertide	Umbria	2023	2024	in costruzione	in anticipo	125
Nuova CP Zambla	Toscana	2023	2026	in autorizzazione	come da programma	26
Installazione TR CP Ardenno	Lombardia	2016	2024	in costruzione	come da programma	2.554
Nuova CP VULCANO CDS	Lombardia	2020	2025	in costruzione	posticipazione volontaria	1.967
Nuova CP PONTE	Lombardia	2020	2024	in costruzione	in anticipo	2.961
CP BRESSANA - Rif. Sez. MT+Nuova fabb	Lombardia	2019	2024	in costruzione	in anticipo	3.344
Ampliamento CP PIEVE E.	Lombardia	2020	2024	completato	come da programma	2.561
Ampliamento CP CORSICO	Lombardia	2021	2023	completato	come da programma	488
Ampliamento CP Pavia Tor.	Lombardia	2020	2025	in costruzione	come da programma	4.473
CP BRUSUGLIO -Rif. Sez. MT	Lombardia	2021	2024	in costruzione	come da programma	3.083
CP BAGNOLO MELLA - Rif. Sez. MT	Lombardia	2021	2026	in costruzione	in anticipo	91
CP CALEPPIO - Rif. Sez. MT	Lombardia	2021	2024	in costruzione	come da programma	1.350
Rifacimento + Ampliamento Sez. MT CP PEGOGNAGA	Lombardia	2021	2024	in costruzione	come da programma	972
CP NOVEDRATE - Rif. Sez. MT	Lombardia	2021	2027	pianificato	come da programma	0
Ampliamento CP SETTIMO + Rif. Sez. MT in fabbricato	Lombardia	2021	2024	in costruzione	posticipazione volontaria	2.712
Nuovo Csat AZZIDA	Friuli-Venezia Giulia	2021	2025	in autorizzazione	in ritardo	142
Adeguamento CP Arsiero	Veneto	2015	2023	completato	come da programma	1.957
Potenziamento CP S.GIOBBE	Veneto	2020	2025	in costruzione	come da programma	2.754
Nuova CP QUERO	Veneto	2020	2025	in costruzione	come da programma	2.573
Nuova CP VIGONOVO	Veneto	2019	2024	in costruzione	in ritardo	4.662
Nuova CP FORONI	Veneto	2020	2024	in costruzione	in ritardo	4.024
Nuova CP PIOMBINO DESE	Veneto	2020	2024	completato	in ritardo	4.041

Nome Intervento	Area Geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
CP SCHIO - Rif. Sez. MT	Veneto	2021	2025	in costruzione	come da programma	1.668
CP San Colombano - Rif. Sez. MT	Liguria	2023	2030	in costruzione	posticipazione volontaria	444
Nuovo CSat Cavassolo	Liguria	2014	2023	completato	in anticipo	188
Potenziamento CP LA PIANTA	Liguria	2020	2024	in costruzione	in anticipo	1.489
Nuova CP TORRIGLIA	Liguria	2021	2026	in costruzione	come da programma	343
GENOVA TERMICA - Rif. Sez. MT	Liguria	2021	2027	in autorizzazione	come da programma	214
TRASTA - Rif. Sez. MT	Liguria	2021	2028	pianificato	posticipazione volontaria	69
Domodossola - Rif. Sez. MT	Piemonte	2018	2027	pianificato	come da programma	30
Potenziamento CP Spinetta	Piemonte	2019	2024	in costruzione	in anticipo	2.171
Nuova CP Novara Est	Piemonte	2019	2024	completato	in ritardo	5.021
Potenziamento CP Rivara	Piemonte	2020	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	posticipazione volontaria	850
Nuova CP Sparone	Piemonte	2019	2024	in costruzione	come da programma	1.513
Nuova CP Cuneo Nord	Piemonte	2019	2024	in costruzione	in ritardo	3.150
Nuova CP CEBROSA	Piemonte	2021	2024	in costruzione	in anticipo	1.429
Rifacimento CP SCARMAGNO	Piemonte	2021	2027	in autorizzazione	come da programma	38
CP CARMAGNOLA - Rif. Sez. MT	Piemonte	2021	2027	in autorizzazione	come da programma	2
CP SERRAVALLE - Rif. Sez. MT	Piemonte	2021	2026	in costruzione	posticipazione volontaria	898
Nuova CP Assemimi	Sardegna	2019	2025	in costruzione	in ritardo	3.822
Nuova CP Loiri Porto S.Paolo	Sardegna	2019	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	in anticipo	1.474
Nuova CP Selegas	Sardegna	2020	2025	in autorizzazione	in anticipo	1.216
Nuova CP Trinità d'Agultu	Sardegna	2020	2028	in costruzione	in ritardo	1.757
Nuova CP Villaspeciosa	Sardegna	2021	2028	pianificato	posticipazione volontaria	0
Nuova CP Terramala	Sardegna	2020	2025	in costruzione	in ritardo	2.143
Nuova CP Pula	Sardegna	2020	2023	completato	come da programma	3.899
Nuova CP Oliaspesciosa	Sardegna	2020	2027	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	44
Nuova CP Alghero Sud	Sardegna	2020	2027	in autorizzazione	come da programma	259
Nuova CP Villamassargia	Sardegna	2021	2024	completato	in ritardo	3.096
Nuova CP Posada	Sardegna	2021	2025	in costruzione	in ritardo	2.855
Nuova CP NULVI	Sardegna	2021	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	in anticipo	23
Ampliamento Sez. MT CP OLBIA	Sardegna	2021	2024	in costruzione	posticipazione volontaria	690
Adeguamento CP TALORO 2	Sardegna	2022	2024	in costruzione	come da programma	197
Ampliamento CP Viagrande	Sicilia	2021	2024	in costruzione	in anticipo	1.015
Sostituzione TR + QMT CP Guadalami	Sicilia	2014	2023	completato	come da programma	2.556
Rifacimento blindato AT CP Catania Nord	Sicilia	2015	2024	completato	in ritardo	1.502
Sostituzione TR CP Augusta	Sicilia	2021	2024	in costruzione	in anticipo	731
Nuova CP Santa Ninfa	Sicilia	2019	2023	completato	come da programma	801
Nuova CP Grottafumata	Sicilia	2018	2024	completato	in ritardo	956
Nuova CP Scordia	Sicilia	2019	2024	completato	in ritardo	1.179
Nuova CP Valguarnera	Sicilia	2018	2023	completato	come da programma	1.007
Nuova CP Agrigento	Sicilia	2018	2023	completato	come da programma	329
Nuova CP Filonero	Sicilia	2020	2025	in costruzione	in ritardo	2.789
Nuova CP S. Giorgio	Sicilia	2016	2028	in costruzione	in ritardo	3.023

Nome Intervento	Area Geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
Ampliamento CP Ragusa 2	Sicilia	2021	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	in ritardo	1.628
Nuovo CSat Trecastagni	Sicilia	2022	2024	in costruzione	in anticipo	139
Nuova CP Università Palermo	Sicilia	2022	2027	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	in ritardo	39
Nuova CP Nicolosi (ex CP S.P.Clarenza)	Sicilia	2022	2024	in costruzione	come da programma	2.248
Nuova CP Gattopardo (ex CP Sambuca)	Sicilia	2021	2028	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	in ritardo	83
CSat Ischia-sostituzione quadro MT e TR	Campania	2016	2023	completato	come da programma	1.113
Nuova CP Molinara	Campania	2019	2025	in costruzione	in ritardo	1.588
Nuova CP Trentola Ducenta (ex CP Casapesenna)	Campania	2026	2030	in autorizzazione	come da programma	13
Nuova CP Acerra	Campania	2021	2028	in autorizzazione	come da programma	7
Nuova CP Agnano	Campania	2026	2031	pianificato	come da programma	3
Nuova CP Fuorigrotta 220	Campania	2021	2028	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	28
Nuova CP Quarto	Campania	2020	2028	in costruzione	in ritardo	1.583
Nuova CP Salerno Porto	Campania	2020	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	6
Ampliamento CP Aversa + QMT	Campania	2016	2023	completato	come da programma	1.660
CP Maddaloni Nuova Sez. AT	Campania	2010	2023	completato	come da programma	2.089
Riclassamento CP Mercatello	Campania	2021	2023	completato	in anticipo	38
CP Giugliano - Rif. Sez. MT	Campania	2020	2024	completato	posticipazione volontaria	699
Sostituzione Sbarre CP Astroni	Campania	2020	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	posticipazione volontaria	125
Sostituzione TR CP Salerno Nord	Campania	2024	2024	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	0
Riclassamento CP Agerola	Campania	2019	2026	in costruzione	posticipazione volontaria	1.155
Trasformazione CP S.Antimo	Campania	2020	2025	in costruzione	in anticipo	1.133
Nuova CP Bagnoli	Campania	2022	2029	pianificato	come da programma	3
CSat De Curtis - Adeguamento Quadro MT	Campania	2020	2023	completato	come da programma	757
CSat Giovi - Rif. Sez. MT	Campania	2021	2024	in costruzione	posticipazione volontaria	481
Sostituzione TR e Rif. Sez. AT CP Pozzuoli	Campania	2020	2024	in costruzione	come da programma	5.143
Adeguamento Stazione CP Matese II	Campania	2026	2027	pianificato	come da programma	0
Riclassamento CP Cassano	Campania	2020	2027	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	14
Ampliamento CP Scafati + Ampliamento QMT	Campania	2020	2025	in costruzione	in anticipo	1.200
Nuova CP Di Vittorio (ex CP Piazza Di Vittorio)	Campania	2025	2028	pianificato	in ritardo	25
Ampliamento CP S. Valentino	Campania	2021	2024	in costruzione	in anticipo	749
Nuova CP ASI NOLA ( Ex CP ASI Marigliano)	Campania	2022	2032	in autorizzazione	in ritardo	468
Ricostruzione completa CP Bari Sud	Puglia	2016	2028	pianificato	posticipazione volontaria	34
CP Martina 60 - Rif. Sez. MT	Puglia	2016	2025	in costruzione	in ritardo	1.226
CP Taranto Est - Rif. Sez. AT e TR	Puglia	2020	2025	in costruzione	posticipazione volontaria	2.778
Nuova CP Bari San Giorgio	Puglia	2015	2029	in costruzione	in ritardo	2.324
Nuova CP Crispiano	Puglia	2021	2026	in costruzione	in ritardo	2.834
Nuova CP Polignano	Puglia	2017	2025	in costruzione	come da programma	1.852
Nuova CP Presicce	Puglia	2020	2027	in costruzione	in ritardo	2.310
Sostituzione QMT e Smartizzazione CP Potenza	Basilicata	2019	2023	completato	come da programma	1.154
Nuova CP Guardia	Basilicata	2020	2024	completato	in ritardo	4.012
CSat Palazzo S. Gervasio - Rif. Sez. MT	Basilicata	2020	2024	in costruzione	come da programma	317

Nome Intervento	Area Geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
Nuova CP Vallefiorita	Calabria	2020	2025	in costruzione	in ritardo	2.173
Ampliamento CP Condura	Calabria	2016	2024	completato	come da programma	1.102
Ampliamento CP Rende	Calabria	2020	2024	completato	come da programma	1.640
Ampliamento CP CROTONE	Calabria	2020	2025	in costruzione	in ritardo	281
Ampliamento CP Lamezia Terme	Calabria	2020	2025	in costruzione	come da programma	566
Nuova CP Mesola	Emilia-Romagna	2020	2026	in costruzione	in ritardo	2.247
Nuova CP Berceto	Emilia-Romagna	2020	2027	in costruzione	come da programma	114
Nuova CP Bobbio ex.Boffalora	Emilia-Romagna	2020	2026	in costruzione	in anticipo	244
Nuova CP Mancasale	Emilia-Romagna	2010	2030	in costruzione	in ritardo	3.786
Nuova CP Fidenza Nord	Emilia-Romagna	2016	2025	in costruzione	in ritardo	4.037
Ampliamento CP Riccione Mare	Emilia-Romagna	2018	2025	in costruzione	in anticipo	512
Nuova CP Schiezza	Emilia-Romagna	2020	2034	in costruzione	in ritardo	1.207
CP Carpi Sud - Nuova Sez. MT	Emilia-Romagna	2020	2025	in costruzione	come da programma	214
Ampliamento CP Felino	Emilia-Romagna	2020	2023	completato	come da programma	515
CP Bologna Nord - Rif. Sez. MT	Emilia-Romagna	2014	2023	completato	come da programma	2.842
Nuova CP Bologna Maggiore	Emilia-Romagna	2010	2027	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	647
CP Imola - Rif. Sez. MT	Emilia-Romagna	2021	2023	completato	come da programma	1.745
Nuova CP Ronciglione	Lazio	2020	2028	in autorizzazione	posticipazione volontaria	2.855
Nuova CP Olimpo	Lazio	2021	2025	in costruzione	come da programma	2.553
Nuova CP Fossignano	Lazio	2020	2023	completato	come da programma	2.938
Nuova CP Fara	Lazio	2020	2024	in costruzione	come da programma	2.209
Nuova CP Orte	Lazio	2025	2027	in autorizzazione	come da programma	11
Nuova CP Nettuno	Lazio	2026	2028	in autorizzazione	posticipazione volontaria	12
Ampliamento e Potenziamento Sez. MT CP Viterbo	Lazio	2017	2023	completato	come da programma	2.408
Ampliamento CP Colonnella	Lazio	2026	2027	pianificato	come da programma	0
Ampliamento CP S.Rita	Lazio	2021	2023	completato	come da programma	1.709
Nuova CP Basciano	Abruzzo	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma	78
Nuova CP Castilenti	Abruzzo	2021	2026	in costruzione	in ritardo	3.702
Nuova CP Porto S.Elpidio	Marche	2016	2023	completato	come da programma	2.342
Nuova CP Campofilone	Marche	2021	2025	in costruzione	in ritardo	3.525
Nuova CP Senigallia Ovest	Marche	2021	2024	in costruzione	come da programma	1.723
Nuova CP Jesi Est	Marche	2021	2026	in costruzione	come da programma	195
Nuova CP Villa Potenza	Marche	2021	2025	in costruzione	in anticipo	991
Ampliamento + Nuovo raccordo AT CP Rosia	Toscana	2018	2026	in costruzione	in anticipo	386
CP Varlungo - Rif. Sez. AT	Toscana	2012	2026	in costruzione	in anticipo	461
CP Prato San Paolo - Rif. Sez. MT	Toscana	2019	2026	in costruzione	in anticipo	132
Nuova CP Cinigiano	Toscana	2020	2025	in costruzione	in anticipo	2.603
Nuova CP San Miniato	Toscana	2021	2025	in costruzione	in anticipo	140
Nuova CP Camaiore	Toscana	2022	2028	pianificato	in ritardo	10
Nuova CP Torrita	Toscana	2020	2027	in costruzione	in ritardo	2.309
Nuova CP Università	Toscana	2010	2024	completato	in ritardo	4.277
Allacciamento Cliente AT GNUTTI - Urago d'Orglio	Lombardia	2017	2024	in costruzione	come da programma	1.152
Ampliamento CP ACQUANEGRA	Lombardia	2020	2023	completato	in anticipo	0

Nome Intervento	Area Geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
CP CAPONAGO - Rif. Sez. MT	Lombardia	2021	2025	in costruzione	posticipazione volontaria	1.939
CP CHIAMPO - Rif. Sez. MT	Veneto	2021	2027	in costruzione	come da programma	209
Nuova CP CASTEGNERO	Veneto	2013	2024	in costruzione	come da programma	1.559
Nuova CP Antoniana	Liguria	2018	2025	in costruzione	come da programma	5.484
CP Grugliasco - Rif. Sez. MT	Piemonte	2018	2024	in costruzione	in ritardo	1.753
CP Borgaro - rifacimento impianto	Piemonte	2017	2023	completato	come da programma	3.456
Nuova CP Avola	Sicilia	2021	2024	in costruzione	come da programma	3.033
Ampliamento CP Avellino N.	Campania	2020	2024	in costruzione	in ritardo	1.711
Riclassamento CP Sorrento	Campania	2020	2024	in costruzione	come da programma	2.158
Riclassamento CP Vico	Campania	2020	2027	in costruzione	posticipazione volontaria	903
Nuova CP Suio	Campania	2017	2024	in costruzione	in ritardo	3.305
Nuovo CSat Crescent (Porto Salerno)	Campania	2021	2023	completato	come da programma	417
CP Poggio reale nuovo stallo AT	Campania	2022	2024	in costruzione	come da programma	654
CP Fratta (ex SE Fratta) - Rif. Sez. MT	Campania	2019	2024	completato	come da programma	0
CP Foce V. - Rif. Sez. AT	Campania	2020	2027	in costruzione	posticipazione volontaria	1.454
CP Doganella - allacciamento CeSMA	Campania	2018	2023	completato	come da programma	2.924
CP Casoria 2 - terzo TR per RFI	Campania	2017	2023	completato	come da programma	2.059
CSat Tagliamento - Rif. Sez. MT	Campania	2020	2024	completato	come da programma	0
CP Casarano - realizzazione 3° montante AT/MT	Puglia	2019	2023	completato	come da programma	2.669
Nuova CP Foggia Nord	Puglia	2020	2025	in costruzione	posticipazione volontaria	4.288
Nuova CP Ostuni Mare	Puglia	2020	2025	in costruzione	come da programma	1.590
Nuova CP Altamura Nord	Puglia	2021	2030	in autorizzazione	in ritardo	1.563
Nuova CP Bisceglie Sud	Puglia	2020	2024	in costruzione	come da programma	1.729
Ampliamento CP Livorno La Rosa	Toscana	2020	2025	in costruzione	posticipazione volontaria	2.558

## Interventi AT annullati

Nome Intervento	Area Geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento
Ricostruzione Sez. MT CP MUSOCCO	Lombardia	2024	-	cancellato
Ampliamento CP Lacchiarella	Lombardia	2023	-	cancellato
CP Missanello (ex Agri) - Nuova Sez.	Basilicata	2022	-	cancellato
Nuova CP Sassuolo Nord	Emilia Romagna	2022	-	cancellato
Nuova CP Bastiglia	Emilia Romagna	2023	-	cancellato
Potenziamento CP Cuneo S.Giacomo	Piemonte	2021	-	cancellato
Potenziamento CP Manfredonia Ind	Puglia	2017	-	cancellato
CP VITTUONE - Rif. Sez. MT	Lombardia	2021	-	cancellato

## 2.2. Interventi MT

### Interventi MT nominativi

Nome Intervento	Area geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
2 ALIMENT CP Fuorigrotta C.Sat Morghe	Campania	2021	2025	in costruzione	come da programma	231
2 NUOVI ALIM. ASTRONITRAIANO	Campania	2021	2025	in costruzione	in ritardo	2.074
Eliminazione Sezionatore Zeccola	Campania	2021	2024	completato	in anticipo	399
Nuova LMT SOPHIA CANCELLIO ARNONE	Campania	2021	2025	in costruzione	posticipazione volontaria	366
PROJECT LMT FUORE	Campania	2020	2023	completato	come da programma	2.909
Nuova MT CP S.Valentino cs Acciara 2	Campania	2021	2023	completato	come da programma	905
Nuova MT CP S.Valentino cs Pendino	Campania	2021	2023	completato	come da programma	876
Prog ALIM CSat S. BARBARA	Campania	2021	2025	in costruzione	in ritardo	895
Raccordo SANZA ROFRANO	Campania	2020	2023	completato	come da programma	655
Riassetto Rete Teano	Campania	2016	2027	in costruzione	come da programma	1.156
LMT RISPO 31585	Campania	2020	2023	completato	come da programma	1.003
Feeder per CSat POMPEI	Campania	2018	2024	completato	come da programma	1.003
Riassetto LMT MT VERDI E MONTI	Campania	2017	2023	completato	come da programma	1.568
Uscenti MT da CP Teano	Campania	2018	2026	in costruzione	come da programma	278
Nuove Uscenti da CP Benevento_Ind	Campania	2018	2024	in costruzione	posticipazione volontaria	318
LMT VELCARTA	Campania	2020	2025	in costruzione	in ritardo	648
Nuova Cabina Primaria CASAPESENNA	Campania	2021	2030	pianificato	posticipazione volontaria	4
Prosegue Uscenti CP CASAPESENNA	Campania	2021	2030	pianificato	posticipazione volontaria	14
4 Nuove Uscenti da S.ANTIMO D6001375395	Campania	2021	2025	in costruzione	come da programma	77
Nuova SORRENTO150 D6001380619	Campania	2021	2026	in costruzione	come da programma	226
Nuove Uscenti da SORRENTO150	Campania	2021	2025	in costruzione	in anticipo	729
Nuove Uscenti SORRENTO150	Campania	2021	2025	in costruzione	in anticipo	41
Nuova Uscente Macchione da CP Salento	Campania	2020	2027	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	in ritardo	264
Nuove Uscenti da CP Centola	Campania	2020	2026	in autorizzazione	come da programma	600
LMT GAIANO	Campania	2020	2023	completato	come da programma	782
Nuove Uscenti CP ARIANO	Campania	2020	2023	completato	come da programma	1.208
LMT SERRE D ANN Sost Nudo con Elicord	Campania	2021	2023	completato	come da programma	556
4.0 LMT FERRANTINA 10152	Campania	2020	2025	in costruzione	posticipazione volontaria	678
Rifac.1.Trat.L.1TORREGREC	Campania	2021	2025	pianificato	come da programma	6
Nuova Uscente Roata Rossi (CP Cuneo Nord)	Piemonte	2021	2025	in costruzione	in ritardo	690
Nuova Uscente S.Pietro del Gallo (CP Cuneo Nord)	Piemonte	2022	2025	in costruzione	in ritardo	964
Nuova Uscente MT CARAGLIO - CP Cuneo Nord	Piemonte	2021	2025	in costruzione	in ritardo	912
Nuove Uscenti CP CASTELMASSIMO	Lazio	2020	2026	in autorizzazione	come da programma	4
Nuove Uscenti CP MARANOLA	Lazio	2020	2024	completato	come da programma	782
Feeder CSS SCAURI	Lazio	2019	2024	completato	come da programma	962
LMT MUGGIA	Friuli-Venezia Giulia	2021	2025	in costruzione	come da programma	160
Raccordi MT da CP Brentelle	Veneto	2015	2023	completato	come da programma	2.053
Nuova CP VIGONOVO Raccordi MT	Veneto	2020	2025	in costruzione	come da programma	1.494
-Nuova LMT S. GIORGIO	Veneto	2021	2025	pianificato	come da programma	48
Raccordi Nuova CP Valiese	Veneto	2021	2025	in autorizzazione	come da programma	58

Nome Intervento	Area geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consumitivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
Nuova LMT Lenze	Calabria	2020	2023	completato	come da programma	521
Nuova LMT Peep	Calabria	2020	2025	in costruzione	posticipazione volontaria	414
Nuova LMT Vitulia da CP Rende	Calabria	2020	2024	completato	posticipazione volontaria	654
Interramento LMT Faini ed Acquappesa	Calabria	2021	2024	in costruzione	in ritardo	457
LMT PizzoSost. tratte Cavo interrato	Calabria	2021	2023	completato	come da programma	676
LMT Litoranea Sostituzione tratta	Calabria	2021	2023	completato	come da programma	751
Nuove LMT MT da CP Canicattì 2	Sicilia	2019	2024	in costruzione	come da programma	5
Rifacimento prima tratta LMT Piano Talvolta	Sicilia	2019	2025	in autorizzazione	in ritardo	20
Raccordi CP Alia	Sicilia	2020	2024	in costruzione	come da programma	722
Raccordi CP Acireale	Sicilia	2021	2024	completato	in ritardo	1.162
Nuove Uscenti CP Caltagirone 2	Sicilia	2024	2025	in costruzione	in ritardo	0
Raccordi CP Filonero	Sicilia	2024	2025	in costruzione	in ritardo	0
Aumento Potenza Calvi Merate	Lombardia	2018	2025	in autorizzazione	in ritardo	85
GHEDI-COM.VI STORMO AUM.Potenziamento	Lombardia	2018	2024	in costruzione	in ritardo	59
Aumento Potenza SAN GRATO SPA 7MW-Malonno	Lombardia	2018	2023	completato	come da programma	613
Raccordi CP Madone - Progetto Speciale DS	Lombardia	2020	2023	completato	come da programma	1.553
Nuova LMT MONTE PAGANO	Lombardia	2021	2024	in costruzione	come da programma	2.192
Nuova MT VILLALUNGA	Lombardia	2021	2026	pianificato	posticipazione volontaria	1.150
Nuova LMT MT E94E96 CP CONCESIO	Lombardia	2021	2025	in costruzione	in ritardo	677
Interramento LMT MT C.FALCONE ASINARA	Sardegna	2018	2025	in costruzione	come da programma	872
Nuovo Cavo sottomarino Isola di Caprera	Sardegna	2025	2027	pianificato	posticipazione volontaria	0
Feeder + Raccordi a easySAT Gonnosfanadiga	Sardegna	2019	2026	in costruzione	posticipazione volontaria	297
Feeder a Nuovo easySAT Gonnese	Sardegna	2021	2027	autorizzato e in fase si progettazione esecutiva	posticipazione volontaria	31
Feeder a Nuovo easySAT Calasetta	Sardegna	2022	2027	autorizzato e in fase si progettazione esecutiva	posticipazione volontaria	38
Feeder a Nuovo easySAT S.Cristoforo	Sardegna	2021	2025	in costruzione	come da programma	1.537
Nuova Uscente MT S.OLIVARIU - CP Pula	Sardegna	2021	2024	in costruzione	come da programma	182
Nuova Uscente MT BACU CURZU - CP Terramala	Sardegna	2021	2025	in costruzione	Come da programma	821
Nuova Uscente MT S.ISIDORO 2 - CP Terramala	Sardegna	2023	2025	in costruzione	Come da programma	419

## Interventi MT annullati

Nome Intervento	Area geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento
Nuove coppie Alim PogCav.	Campania	2021	-	cancellato
3 nuovi alimentatori per C.SAT Tribunali	Campania	2021	-	cancellato
ALIMENTATORI CERCOLA/S.SEBASTIANO	Campania	2024	-	cancellato

## Interventi MT aggregati

Nome Intervento	Area geografica	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Investimento consuntivo cumulato al 31.12.2023 (k€)
Aggregato MT Abruzzo	Abruzzo	2020-2024	2023 - 2027	In autorizzazione	come da programma	7.216
Aggregato MT Basilicata	Basilicata	2021-2023	2023 - 2026	in costruzione	come da programma	4.823
Aggregato MT Calabria	Calabria	2021-2024	2023 - 2026	in costruzione	come da programma	15.641
Aggregato MT Campania	Campania	2021-2025	2023 - 2027	in costruzione	come da programma	20.069
Aggregato MT Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	2021-2023	2024 - 2027	in costruzione	come da programma	9.444
Aggregato MT Friuli-Venezia Giulia	Friuli-Venezia Giulia	2021-2023	2023 - 2026	in costruzione	come da programma	7.472
Aggregato MT Lazio	Lazio	2021-2024	2023 - 2027	in costruzione	come da programma	21.921
Aggregato MT Liguria	Liguria	2021-2023	2024 - 2026	in costruzione	come da programma	2.581
Aggregato MT Lombardia	Lombardia	2021-2024	2023 - 2026	in costruzione	come da programma	41.152
Aggregato MT Marche	Marche	2021-2023	2024 - 2026	In autorizzazione	come da programma	1.259
Aggregato MT Molise	Molise	2021-2023	2023 - 2027	in costruzione	come da programma	675
Aggregato MT Piemonte	Piemonte	2021-2023	2024 - 2026	in costruzione	come da programma	14.292
Aggregato MT Puglia	Puglia	2020-2024	2023 - 2027	in costruzione	come da programma	28.867
Aggregato MT Sardegna	Sardegna	2021-2023	2024 - 2026	in costruzione	come da programma	9.872
Aggregato MT Sicilia	Sicilia	2018-2023	2023 - 2027	completato	come da programma	47.005
Aggregato MT Toscana	Toscana	2020-2024	2023 - 2027	in costruzione	come da programma	13.942
Aggregato MT Umbria	Umbria	2022-2024	2023 - 2027	in costruzione	come da programma	6.300
Aggregato MT Veneto	Veneto	2021-2023	2023 - 2026	in costruzione	come da programma	27.072

## Appendice

Di seguito si riportano i dettagli relativi alle informazioni presentate nel Capitolo 2:

- *Nome intervento*: descrizione sintetica dell'intervento;
- *Area geografica*: ubicazione dell'intervento;
- *Data di avvio dei lavori*: anno di avvio cantieri;
- *Data di entrata in esercizio*: anno di entrata in esercizio dell'intervento;
- *Stato dell'intervento*: stato di esecuzione dell'intervento (pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato);
- *Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo*: progresso dell'intervento rispetto a quanto riportato nell'ultimo PdS (in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato);
- *Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2023*: consuntivo dell'intervento al 31.12.2023.
